

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ



Imagen pendiente

Objetivo general:

Mejorar el soporte de las tecnologías de información en la Entidad

Código BPIN: 2018011000206

Sector: Hacienda

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

Entidad: UGPP


Responsable: Martha Virginia Orjuela Henao

Horizonte: 2019 - 2023

Presupuesto 2021: \$ 7.888.655.374

Control Posterior: 26/10/2021

Seguimiento de: diciembre 2021

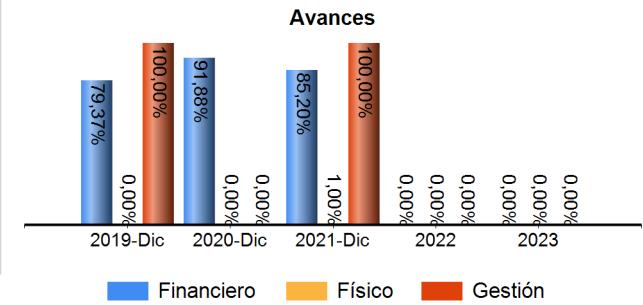

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Gestionar adecuadamente la Información de la entidad

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

Observaciones : Se entregaron las mejoras evolutivas de los Sistemas de cobros, BPM, RECPEN, jurídica, Sede Electrónica y programas de iniciativa de Gobierno nacional

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar el Sistema de Información	PGN	\$3.043.564.426	\$1.282.397.662	\$1.171.639.526
Diseñar el sistema de información	PGN	\$1.091.712.236	\$1.667.116.961	\$1.523.131.383
Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información	PGN	\$608.365.056	\$384.719.299	\$351.491.858
Definir requerimientos funcionales y no funcionales	PGN	\$572.267.205	\$1.154.157.896	\$1.054.475.573
Desplegar en producción el sistema de información	PGN	\$697.285.080	\$769.438.597	\$702.983.715
Alistar la plataforma base del sistema de información	PGN	\$1.756.666.371	\$2.520.408.959	\$1.806.723.936
TOTAL		\$7.769.860.374	\$7.778.239.374	\$6.610.445.991

Documento para la planeación estratégica en TI

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos para la planeación estratégica en TI - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
Observaciones : Se finalizó lo referente al modelo de negocio y las fuentes estandarizadas de la unidad de negocio de Parafiscales					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Analizar la gestión de información comprendida en la planeación estratégica en TI	PGN	\$11.879.500	\$27.604.000	\$27.604.000	
Diseñar los procesos, políticas, roles y responsabilidades	PGN	\$23.759.000	\$22.083.200	\$22.083.200	
Definir las fases de implementación del modelo	PGN	\$59.397.500	\$55.208.000	\$55.208.000	
Documentar el modelo de gestión de información de la planeación estratégica de TI	PGN	\$23.759.000	\$5.520.800	\$5.520.800	
Realizar ajustes organizacionales para la operación del modelo definido en la planeación	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$118.795.000	\$110.416.000	\$110.416.000	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2023

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	3.577.000.000	3.577.000.000	5.922.854.850	5.850.829.839	4.700.748.728	4.472.507.484	Financiero 79,37% Físico 0,00% Gestión 100,00%
2020-Dic	7.617.141.565	6.147.454.698	6.147.454.698	6.112.785.666	5.648.365.876	5.648.365.876	Financiero 91,88% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2021-Dic	5.782.669.870	7.888.655.374	7.888.655.374	7.809.614.540	6.720.861.991	6.720.861.991	Financiero 85,20% Físico 1,00% Gestión 100,00%

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2022	11.925.759.437	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2023	6.981.760.335	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (23/01/2022)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	7.888.655.374	7.888.655.374	7.809.614.540	6.720.861.991	6.720.861.991	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	7.888.655.374	7.888.655.374	7.809.614.540	6.720.861.991	6.720.861.991	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	7.888.655.374	7.888.655.374	7.809.614.540	6.720.861.991	6.720.861.991	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	7.888.655.374	7.888.655.374	7.809.614.540	6.720.861.991	6.720.861.991	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	7.888.655.374	7.888.655.374	7.888.655.374	7.888.655.374	7.888.655.374	7.888.655.374	7.888.655.374	7.888.655.374	7.888.655.374	7.888.655.374	7.888.655.374	7.888.655.374
Avance Financiero	0,00 %	0,32 %	3,45 %	8,45 %	11,65 %	21,78 %	39,95 %	43,80 %	45,65 %	54,27 %	62,50 %	85,20 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	80,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	100,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	3.851.149.382	4.048.251.959	4.024.026.606	3.353.429.426	3.353.429.426
	Servicios	Aportes Nacion	1.931.520.488	3.840.403.415	3.785.587.933	3.367.432.565	3.367.432.565
Total			5.782.669.870	7.888.655.374	7.809.614.540	6.720.861.991	6.720.861.991

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Fases desarrolladas	10	10,00	100,00 %
Observaciones: Se cumplio con los objetivos propuestos de mejora. Clouck Pack como proyecto no se cumplio en su totalidad por temas de inconvenientes en la infraestructura			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	7.888.655.374	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	85,20 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2021	Valor inicial 2021 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2021 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ -
2018011000206
